

キャブテンパイル工法 施工情報シート

管理No	007	提案名	PCリング周囲捨てコンクリートの省力化		
提案年月日	2006/8/8	会社名	(株)長谷工コーポレーション	氏名	熊谷正樹

1. 現況

捨てコンクリートを2回打設している(図1)。
一回目: 杭頭処理完了後、二回目: 杭頭部無収縮モルタル完了後(写真1)。

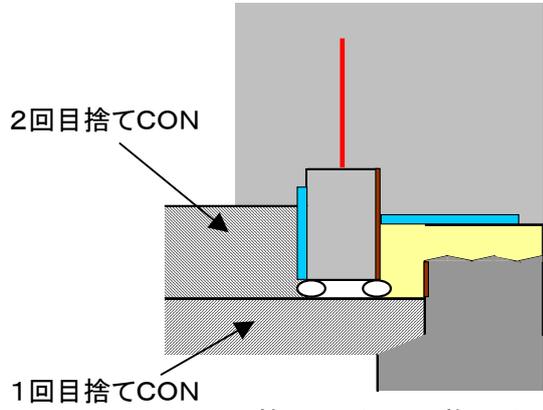



図1: 捨てコンクリート施工断面



写真1. 2回目捨てコンクリート完了

2. 提案方法又は改善事例

2回目捨てコンクリート打設しないで、基礎(フーチング)コンクリートを1回目捨てコンクリートの上に直接打設する。

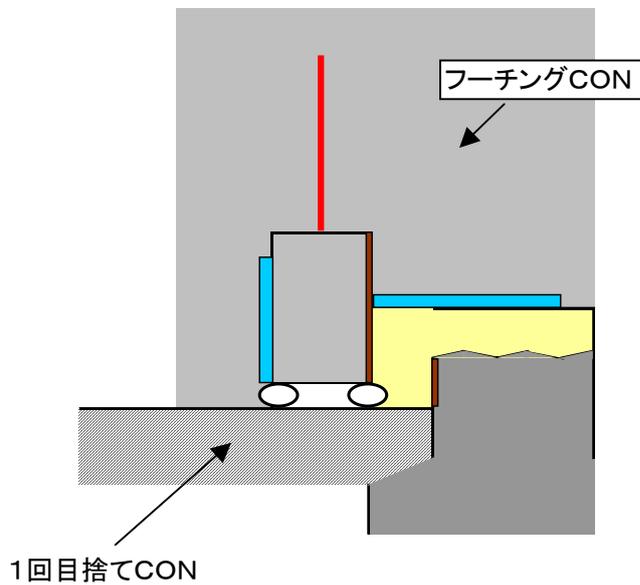

3. 検討結果

検討終了年月日 2006/11/9

判定区分	提案	A	B	C	D	E	備考

・PCリングを拘束することはないことから、標準的な施工方法とする。
