


## キャプテンパイル工法 施工情報シート

管理No	003	提案名	PCリングのレベル調整プレート採用時の留意事項			
提案年月日	2006/6/28	会社名	松井建設(株)	氏名	小林仁	


### 1. 現況

PCリングにレベル調整プレートを取り付け、杭整形ガイドリングに載せてセットを完了させる場合、杭頭研り面はガイドリング天端より突出すると、PCリング左右天端レベル差が生じる可能性がある。

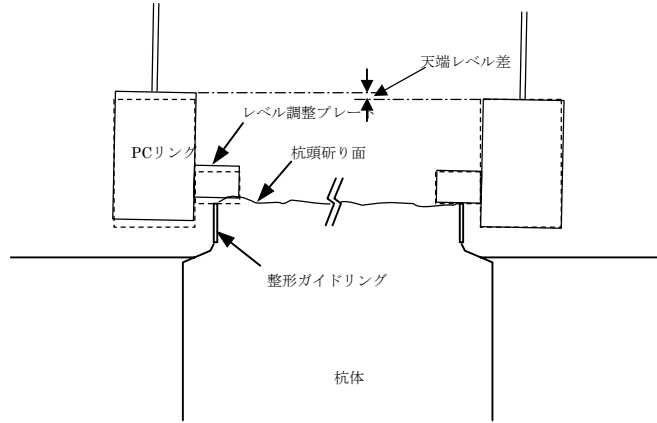

### 2. 提案方法又は改善事例

杭整形ガイドリングから約100mm幅で、杭頭研り面が整形ガイドリングより突出しないように低めに研り取る。

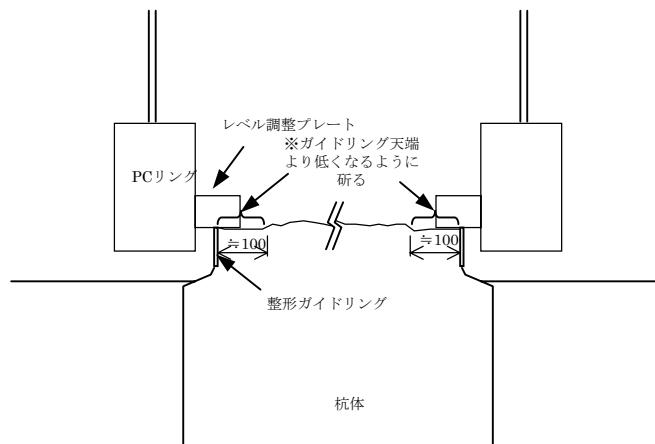

### 3. 検討結果

検討終了年月日

2006/11/9

判定区分	提案	A	B	C	D	E	備考
------	----	---	---	---	---	---	----

・標準的な施工方法とする。
